



Provincia di Modena

Lavori Pubblici

Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

SISMA 2012

RELAZIONE DI SINTESI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Direttore Area Lavori Pubblici – Ing. Alessandro Manni

Aggiornato al 18/11/2020 - Rev. 2

RELAZIONE

A. PREMESSA

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, hanno duramente colpito parte del territorio provinciale, con particolare intensità nella zona Nord della provincia.

Nell'opera di ricostruzione del patrimonio edilizio, si è fatto fronte alle esigenze emerse dopo il sisma con varie opportunità che si sono attivate all'indomani dell'evento calamitoso. Una particolare sensibilità è stata dimostrata da parte di privati cittadini e di aziende sparse sul territorio Nazionale che hanno volontariamente contribuito all'opera di ricostruzione.


Infatti, immediatamente dopo l'evento sismico, è scattata la solidarietà dell'intera Nazione, mediante donazioni volontarie, volte a fronteggiare l'emergenza e tese a contribuire in modo "concreto" alle esigenze conseguenti alla calamità abbattutasi.

Pertanto un particolare ringraziamento va a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno contribuito alla ricostruzione del patrimonio danneggiato.

B. ANALISI FINANZIAMENTI

L'ammontare complessivo delle risorse che la Provincia di Modena ha avuto a disposizione sia per la prima fase emergenziale che, successivamente, per la fase della ricostruzione, ammontano a complessive € **39.223.892,43** derivanti da diverse fonti finanziarie, meglio dettagliate nella tabella e nel grafico sottostanti:


FONTE FINANZIARIA	IMPORTO	QUOTA %
Donazioni	12.573.584,70 €	32,06%
Altri finanziamenti	531.882,72 €	1,36%
Assicurazione	11.200.000,00 €	28,55%
Regione Emilia Romagna	14.918.425,01 €	38,03%
TOTALI	39.223.892,43 €	100,00%

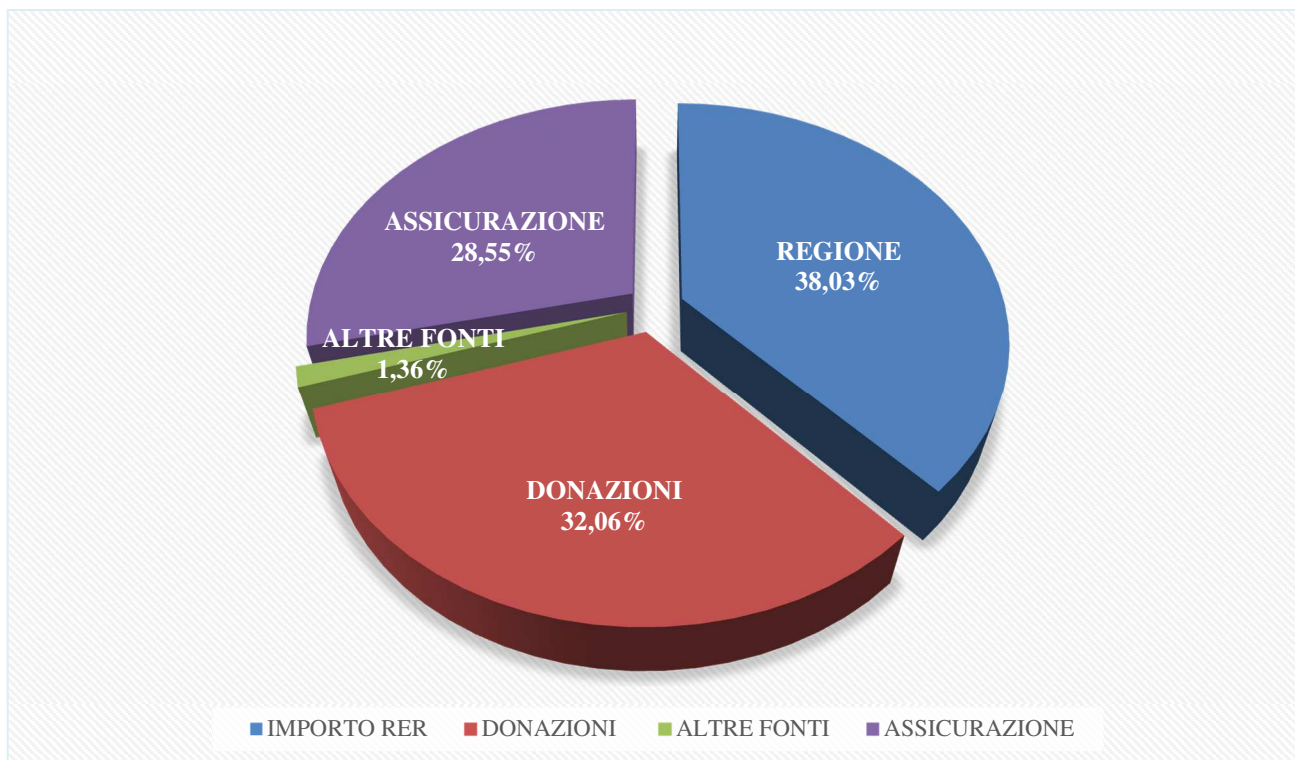


Tenuto conto che l'Amministrazione provinciale ha avuto danni sia al patrimonio edilizio esistente che al patrimonio infrastrutturale viario, le risorse, sono state destinate nel seguente modo:

SETTORE	REGIONE	DONAZIONI	ALTRE FONTI	ASSICURAZIONE	TOTALI
Viabilità	5.537.875,27 €	- €	- €	934.149,03 €	6.472.024,30 €
Edilizia	9.380.549,74 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	10.265.850,97 €	32.751.868,13 €
TOTALI	14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €	39.223.892,43 €

Nei grafici sottostanti, meglio si evince, in termini percentuali, la ripartizione per settore delle risorse a disposizione:

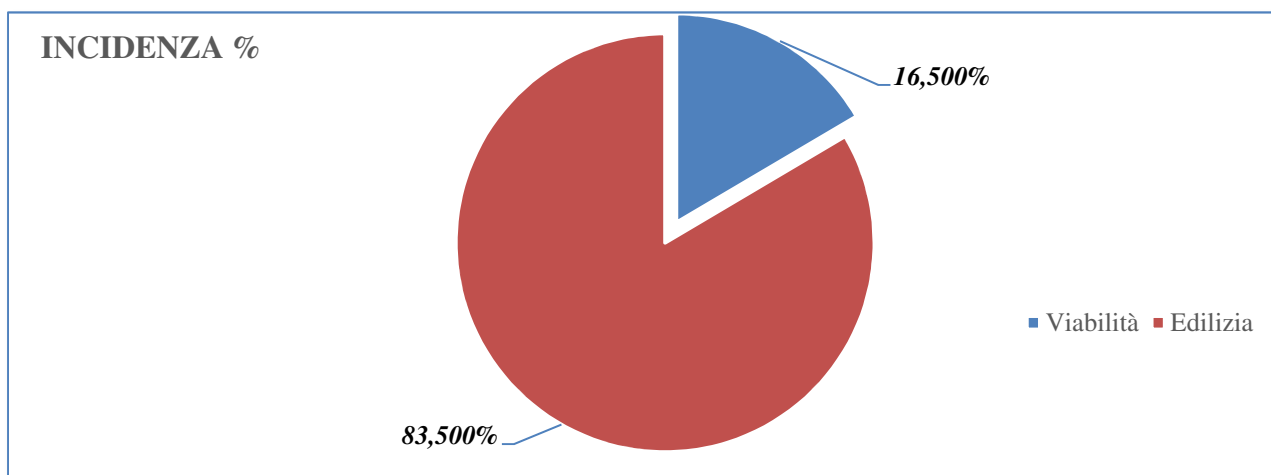

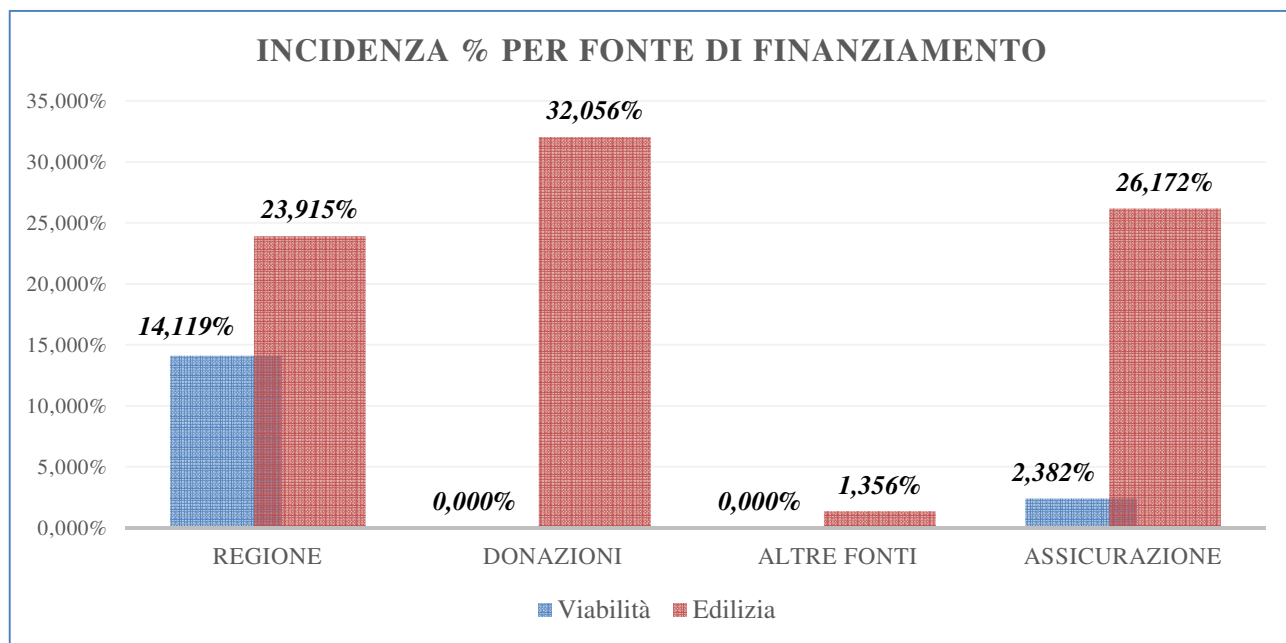

Da una analisi puntuale dei dati sopra riportati, si desume, chiaramente, che le risorse maggiori sono state messe a disposizione, da un lato, dalla Regione Emilia Romagna, per un importo complessivo di 14.918.425,01 €, con una incidenza percentuale del 38,03% e dall'altro, per mezzo di donazioni volontarie, da privati per complessivi 12.573.584,70 € con una incidenza percentuale del 32,06%.

Un particolare cenno va riservato alla quota derivante da Assicurazione. Tale voce di finanziamento, anch'essa rilevante pari a complessivi 11.200.000,00 €, con una incidenza percentuale del 28,55%, si è resa disponibile grazie al rimborso assicurativo derivante da Polizza stipulata sugli edifici scolastici in relazione ad eventi sismici, per la quale è stato riconosciuto il relativo indennizzo.

C. ANALISI DEGLI INTERVENTI


L'ammontare complessivo delle risorse, pari ad € 39.223.892,43, ha interessato la realizzazione di un programma di n. 129 interventi, di cui n. 123 collaudati, n. 3 in corso di realizzazione e n. 3 programmati da realizzare. Le risorse disponibili sono così ripartite:

STATO ATTUAZIONE	NUM. INTERVENTI	IMPORTO
COLLAUDATI	123	35.337.652,15 €
PROGRAMMATI	3	680.000,00 €
IN CORSO	3	3.206.240,28 €
TOTALI	129	39.223.892,43 €

Le risorse sono ulteriormente distinte per SETTORE secondo lo schema qui riportato:

SETTORE	STATO ATTUAZIONE	N. INTERVENTI	IMPORTO
Viabilità	COLLAUDATI	11	6.472.024,30 €
Viabilità	PROGRAMMATI	0	- €
Viabilità	IN CORSO	0	- €
Edilizia	COLLAUDATI	112	28.865.627,85 €
Edilizia	PROGRAMMATI	3	680.000,00 €
Edilizia	IN CORSO	3	3.206.240,28 €
TOTALI		129	39.223.892,43 €

Nel grafico sottostante vengono riportati, in termini percentuali, i dati di cui sopra:

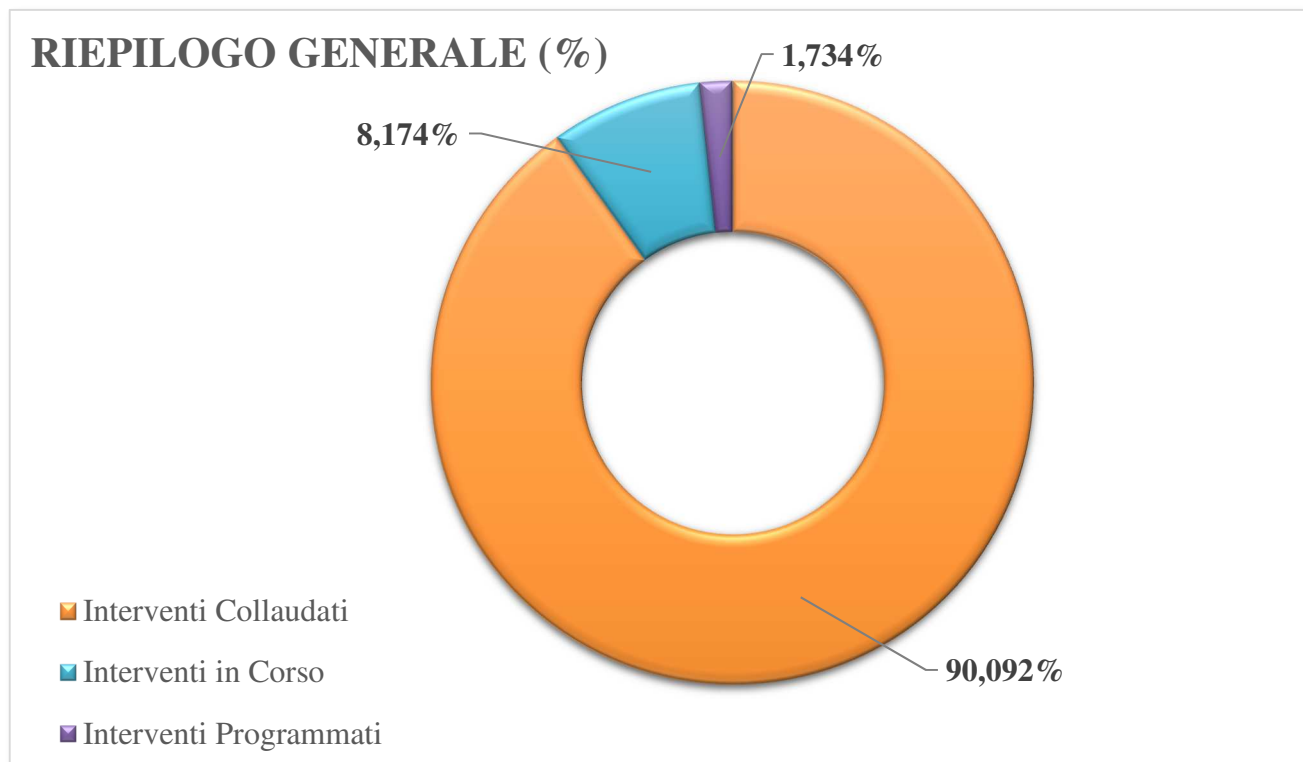

Come facilmente desumibile dal grafico precedente, il programma risulta già completato per il 90,092% che, sommato agli interventi ancora in corso ma di prossimo completamento pari all'8,174%, raggiunge la percentuale complessiva del 98,266%.

Restano da realizzare interventi programmati, pari all' 1,734%, per complessivi € 680.000,00, delle quali € 400.000,00, a carico della Regione Emilia Romagna, di fondi recentemente assegnati ed € 280.000,00 con altre fonti finanziarie di cui € 63.117,28 a carico dell'Assicurazione.

D. RIPARTIZIONE DEGLI INTERVENTI


Le risorse disponibili sono state ulteriormente ripartite per Tipologia di Intervento che, brevemente, vengono riassunte qui di seguito:

1. Lavori
2. Affitto
3. Affitto palestre
4. Arredi
5. Traslochi
6. Trasporto

Nella tabella sottostante vengono ripartite le risorse secondo la tipologia di intervento e per canale di finanziamento:

Tipo intervento	Regione	Donazioni	Altre fonti	Assicurazione	Totali
Lavori	13.154.388,22	12.573.584,70	516.882,72	8.685.016,22	34.929.871,86
Affitto	889.751,01 €	- €	- €	1.765.449,70 €	2.655.200,71 €
Trasporto	- €	- €	- €	151.748,05 €	151.748,05 €
Traslochi	335.000,00 €	- €	- €	111.469,97 €	446.469,97 €
Affitto palestre	205.705,18 €	- €	- €	137.536,37 €	343.241,55 €
Arredi	333.580,60 €	- €	15.000,00 €	348.779,69 €	697.360,29 €



Qui di seguito il grafico dei dati per una rapida lettura degli stessi:

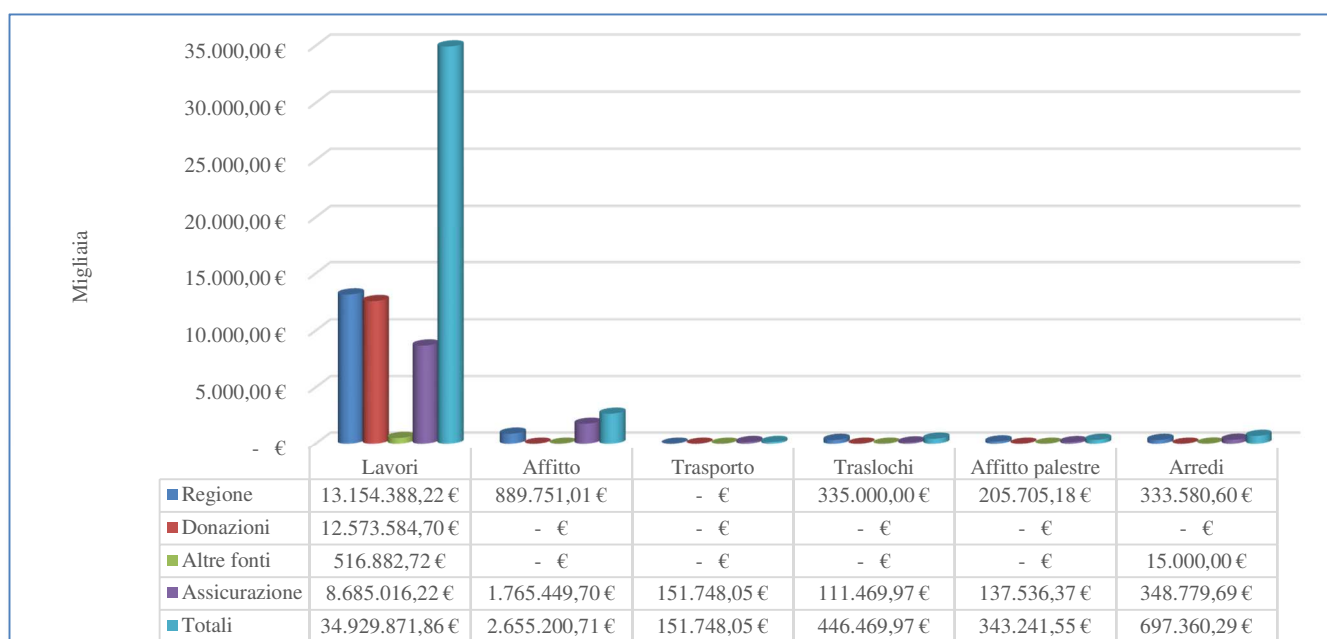

Non è di difficile lettura il grafico sopra riportato, dove salta all'occhio che il maggior impegno finanziario è stato destinato al recupero del patrimonio danneggiato dal sisma del 2012, mentre le altre voci di spesa, sono la diretta conseguenza della realizzazione dei lavori di recupero, come meglio si evince dalla tabella sottostante:

Tipo intervento	Viabilità	Edilizia	Totale
Lavori	6.472.024,30 €	28.457.847,56 €	34.929.871,86 €
Affitto	- €	2.655.200,71 €	2.655.200,71 €
Trasporto	- €	151.748,05 €	151.748,05 €
Traslochi	- €	446.469,97 €	446.469,97 €
Affitto palestre	- €	343.241,55 €	343.241,55 €
Arredi	- €	697.360,29 €	697.360,29 €

Nelle immagini sotto riportate, vengono illustrati, per settore di intervento, i comuni che sono stati interessati dall'opera di messa in sicurezza, prima, e dall'opera di ricostruzione/recupero del patrimonio, in un secondo momento:

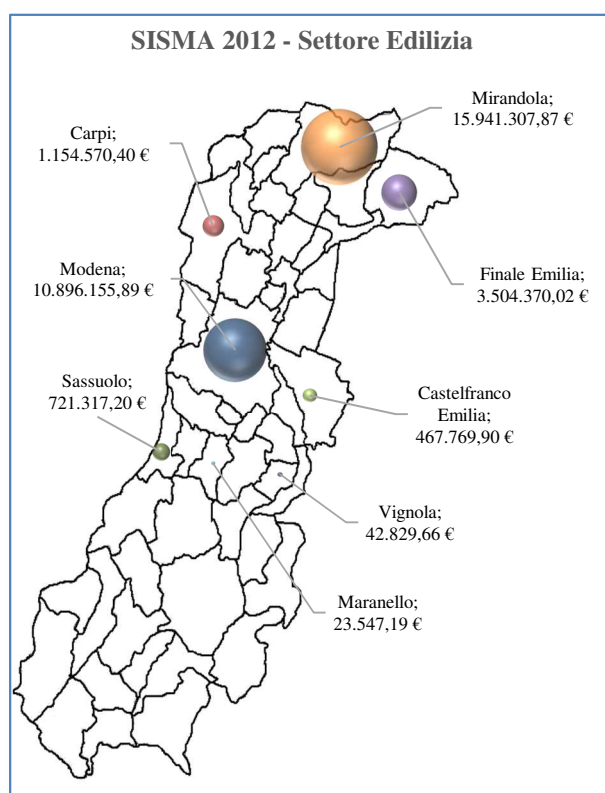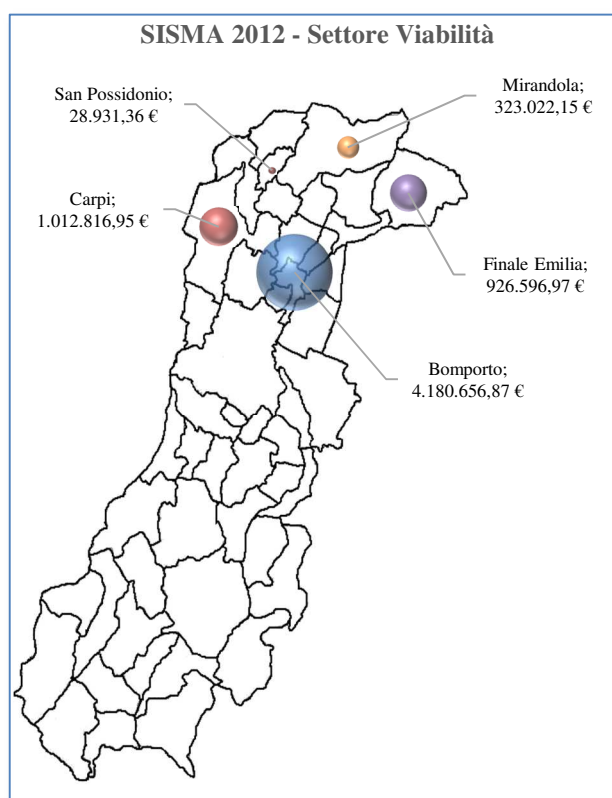

E. CONCLUSIONI

Alla luce dei dati sopra riportati si ritiene di poter affermare con assoluta certezza che l'opera di messa in sicurezza e della fase successiva di ricostruzione/recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale di proprietà della Provincia di Modena, legata agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, possa ritenersi conclusa, fatto salvo la realizzazione degli interventi programmati che saranno attuati nel breve periodo.

Per una consultazione dettagliata dei dati illustrati nella presente relazione, si rimanda alle tabelle allegate in calce alla presente:

1. Allegato A – Riepilogo Generale Interventi – Sisma 2012 – Lavori
2. Allegato B – Riepilogo Generale Interventi – Sisma 2012 – Arredi
3. Allegato C – Riepilogo Generale Interventi – Sisma 2012 – Affitto
4. Allegato D – Riepilogo Generale Interventi – Sisma 2012 – Affitto palestre
5. Allegato E – Riepilogo Generale Interventi – Sisma 2012 – Traslochi
6. Allegato F – Riepilogo Generale Interventi – Sisma 2012 – Trasporto

Modena, 18/11/2020

Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici

(Dott. Ing. Alessandro MANNI)



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Lavori

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
1	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Demolizione edificio principale e palestra	9918	443.149,49 €	Provincia	- €	- €	- €	443.149,49 €	
2	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Opere provvisoriale di puntellamento	8742	4.090,70 €	O.C. n. 57/2013	4.090,70 €	- €	- €	- €	
3	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Ricostruzione edificio principale	707	10.220.000,00 €	Provincia	- €	9.035.569,16 €	- €	1.184.430,84 €	
4	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione officine/laboratori + danni palestra	9921	420.755,84 €	Congruità	181.389,76 €	204.500,00 €	- €	34.866,08 €	208
5	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Ricostruzione palestra	9922	870.000,00 €	Provincia	- €	- €	- €	870.000,00 €	
6	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione ampliamento 2003		600.000,00 €	Provincia	- €	- €	- €	600.000,00 €	
7	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	E	Ristrutturazione EST x LS Pico	9923	630.000,00 €	Provincia	- €	- €	- €	630.000,00 €	Intervento inserito nel QE del progetto di ricostruzione dell'edificio principale per € 480.000,00 + 150000 di Perizia
20	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	9617	2.100.000,00 €	Provincia	- €	2.000.000,00 €	- €	100.000,00 €	
30	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	9917	2.484.948,37 €	Congruità	1.628.862,42 €	833.515,54 €	- €	22.570,41 €	4
31	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Lavori	C	Demolizione palestra ITA Calvi	9915	43.765,70 €	Provincia	- €	- €	- €	43.765,70 €	
32	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Lavori	C	Miglioramento sismico palestra LS Morandi + Cabina ENEL	8888	144.758,08 €	O.C. n. 57/2013	110.699,24 €	- €	- €	34.058,84 €	
33	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione capannoni e casa del Custode ITA Calvi	5108	384.723,43 €	Programma OO.PP.	297.909,24 €	- €	- €	86.814,19 €	
41	IPSIA Vallauri	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale + Palestra	9602	112.831,67 €	Congruità	100.781,65 €	- €	- €	12.050,02 €	161
42	IPSIA Vallauri	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione copertura	9908	188.990,42 €	Provincia	- €	- €	- €	188.990,42 €	
43	ITC Meucci	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	9612	112.807,60 €	Congruità	100.781,65 €	- €	- €	12.025,95 €	159
44	ITC Meucci	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione palestra	8855	93.689,51 €	O.C. n. 57/2013	74.521,10 €	- €	- €	19.168,41 €	
46	ITI L. da Vinci	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		62.833,43 €	Congruità	62.833,43 €	- €	- €	- €	158
47	ITI L. da Vinci	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione officine	8856	96.016,47 €	O.C. n. 57/2013	92.412,25 €	- €	- €	3.604,22 €	
48	ITI L. da Vinci	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione palestra	9041	100.654,65 €	O.C. n. 57/2013	93.390,78 €	- €	- €	7.263,87 €	
49	LS Fanti	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		55.725,20 €	Congruità	55.725,20 €	- €	- €	- €	160
50	LS Fanti	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione palestra	8854	124.243,18 €	O.C. n. 57/2013	121.025,24 €	- €	- €	3.217,94 €	
51	LS Fanti	CARPI	Edilizia	Lavori	C	Riparazione copertura		177.275,78 €	Provincia	- €	- €	- €	177.275,78 €	
53	IPAA Spallanzani	CASTELFRANCO EMILIA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8859	15.111,43 €	O.C. n. 57/2013	15.111,43 €	- €	- €	- €	
55	IPSIA Ferrari	MARANELLO	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		23.547,19 €	Provincia	- €	- €	- €	23.547,19 €	
56	IPCT Cattaneo	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8912	48.572,80 €	O.C. n. 57/2013	48.572,80 €	- €	- €	- €	
57	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione sede Via Belle Arti	8916	95.267,79 €	O.C. n. 57/2013	78.725,34 €	- €	- €	16.542,45 €	
58	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Lavori	E	Riparazione sede Via Dei Servi	708	1.880.938,74 €	Programma OO.PP.	1.483.087,92 €	- €	- €	397.850,82 €	Congruità ridotta rispetto al finanziamento regionale [dati definitivi da collaudo Arch. Paola Vincenzi]
59	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Lavori	E	Miglioramento sismico Via Belle Arti		695.301,54 €	Programma OO.PP.	80.301,54 €	- €	300.000,00 €	315.000,00 €	Congruità prot. 505941/2018 [Determina approvazione esecutivo 411/2019]



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Lavori

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
60	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Adattamento sede provvisoria Via Sgarzeria -1 ° stralcio	8917	351.496,52 €	O.C. n. 57/2013	351.367,99 €	- €	- €	128,53 €	
61	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Adattamento sede provvisoria Via Sgarzeria - 2 ° stralcio	8917	577.640,10 €	O.C. n. 57/2013	572.412,88 €	- €	- €	5.227,22 €	
83	ITC Barozzi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		178.513,12 €	Congruità	157.253,32 €	- €	- €	21.259,80 €	162
84	ITC Barozzi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione danni da sfondellamento		157.808,06 €	Provincia	- €	- €	- €	157.808,06 €	
85	ITG Guarini	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8913	87.919,94 €	O.C. n. 57/2013	79.999,99 €	- €	- €	7.919,95 €	
86	ITG Guarini	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione palestra	5107	179.907,19 €	Programma OO.PP.	179.907,18 €	- €	- €	0,01 €	
89	ITI - IPSIA Corni	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione danni da sfondellamento	8911/2	88.230,64 €	O.C. n. 57/2013	88.230,64 €	- €	- €	- €	
90	ITI - IPSIA Corni	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione strutture primarie		19.996,46 €	Provincia	- €	- €	- €	19.996,46 €	
91	ITI - IPSIA Corni	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione danni ai vari corpi	8911/1	110.811,87 €	O.C. n. 57/2013	110.811,87 €	- €	- €	- €	
92	Polo Corni - Selmi via	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8909	81.450,88 €	O.C. n. 57/2013	81.450,88 €	- €	- €	- €	
93	Polo Corni - Selmi via	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione palestra "Corni"	5106	89.795,92 €	Programma OO.PP.	83.253,32 €	- €	- €	6.542,60 €	
94	Polo Corni - Selmi via	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione palestra "Selmi"	5109	135.064,25 €	Programma OO.PP.	135.064,25 €	- €	- €	- €	
95	Polo Corni - Selmi via	MODENA	Edilizia	Lavori	P	Adeguamento strutturale edificio principale		110.000,00 €	Provincia	- €	- €	110.000,00 €	- €	Bilancio Provincia az. 635 es. 2014 Alienazioni patrimoniali
97	ITI Fermi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8906/2	29.841,65 €	O.C. n. 57/2013	29.841,65 €	- €	- €	- €	
98	ITI Fermi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione danni da sfondellamento	8906/1	89.732,57 €	O.C. n. 57/2013	89.732,57 €	- €	- €	- €	
99	ITI Fermi	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Ricostruzione palazzina ex Bidinelli		1.529.650,11 €	Provincia	- €	500.000,00 €	- €	1.029.650,11 €	
100	LC Muratori	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale + Palestra	8914	128.314,21 €	O.C. n. 57/2013	128.314,21 €	- €	- €	- €	
101	LC S.Carlo	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione muratura e incatenamenti	8915	97.159,24 €	O.C. n. 57/2013	97.159,24 €	- €	- €	- €	
102	IPSS Deledda	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8046	498.292,71 €	Programma OO.PP.	288.668,82 €	- €	- €	209.623,89 €	da verificare se collaudato
103	LS Tassoni	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale	8908	30.333,37 €	O.C. n. 57/2013	30.333,37 €	- €	- €	- €	
104	LS Tassoni	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Interventi di riparazione locali seminterrati		119.059,39 €	Provincia	- €	- €	- €	119.059,39 €	Fondi Provincia - alienazioni az 2535 es. 2014
105	LS Tassoni	MODENA	Edilizia	Lavori	P	Consolidamento strutturale torre biblioteca		170.000,00 €	Provincia	- €	- €	106.882,72 €	63.117,28 €	Fondi Provincia - alienazioni az 2651 es. 2015
106	LS Tassoni	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione succursale	8910	4.647,68 €	O.C. n. 57/2013	4.647,68 €	- €	- €	- €	
108	IPSIA Don Magnani	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		101.104,90 €	Provincia	- €	- €	- €	101.104,90 €	
109	ITI Volta	SASSUOLO	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		60.461,14 €	Provincia	- €	- €	- €	60.461,14 €	
110	IPCT Morante	SASSUOLO	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		46.679,94 €	Provincia	- €	- €	- €	46.679,94 €	
111	LS Formiggini	SASSUOLO	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		7.536,82 €	Provincia	- €	- €	- €	7.536,82 €	
112	ITGC Baggi	SASSUOLO	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		23.608,46 €	Provincia	- €	- €	- €	23.608,46 €	
113	ITGC Baggi	SASSUOLO	Edilizia	Lavori	C	Riparazione danni da sfondellamento		66.963,07 €	Provincia	- €	- €	- €	66.963,07 €	
114	ITGC Baggi	SASSUOLO	Edilizia	Lavori	C	Miglioramento sismico 4^ stralcio e opere complementari		516.067,77 €	Provincia	- €	- €	- €	516.067,77 €	



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Lavori

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
115	ITI - IPI Levi	VIGNOLA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		34.461,57 €	Provincia	- €	- €	- €	34.461,57 €	
117	IPAA Spallanzani	CASTELFRANCO EMILIA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione edificio principale		27.457,60 €	Provincia	- €	- €	- €	27.457,60 €	
118	IPAA Spallanzani	CASTELFRANCO EMILIA	Edilizia	Lavori	P	IPAA Spallanzani - Fabbricati azienda agricola di Gaggio	15021	400.000,00 €	Programma OO.PP.	400.000,00 €	- €	- €	- €	da realizzare
119	Ex caserma Fanti	MODENA	Edilizia	Lavori	C	Riparazione copertura	10193	77.841,40 €	O.C. n. 57/2013	77.841,40 €	- €	- €	- €	
120	SP 468 - Ponte Motta	CARPI	Viabilità	Lavori	C	Primi interventi di messa in sicurezza	7552	159.999,96 €	O.C. n. 57/2013	159.999,96 €	- €	- €	- €	
121	SP 468 - Ponte Motta	CARPI	Viabilità	Lavori	C	Riparazione e rinforzo strutturale		852.816,99 €	Provincia	- €	- €	- €	852.816,99 €	Progetto di € 900.000,00 - accantonati nel QE di Collaudo € 70.428,78 per lavori complementari - eseguito n. 1 intervento compl.
122	SP 1 - Ponte Bomporto	BOMPORTO	Viabilità	Lavori	C	Ricostruzione ponte sul fiume Panaro	8044	700.000,00 €	Programma OO.PP.	700.000,00 €	- €	- €	- €	
123	SP 1 - Ponte Bomporto	BOMPORTO	Viabilità	Lavori	C	Ricostruzione ponte sul fiume Panaro	837	3.480.656,87 €	O.C. n. 57/2013	3.400.000,00 €	- €	- €	80.656,87 €	
124	SP 7 Delle Valli	MIRANDOLA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza sottopasso ferroviario km 11+150	8741	143.415,62 €	O.C. n. 57/2013	143.415,62 €	- €	- €	- €	
125	SP 8 di Mirandola	MIRANDOLA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza ponte sul Secchia km 9+502	7643	150.675,17 €	O.C. n. 57/2013	150.000,00 €	- €	- €	675,17 €	
126	SP 468 di Correggio	FINALE EMILIA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza Ponte sul Panaro km 71+300	7706	379.634,27 €	O.C. n. 57/2013	379.634,27 €	- €	- €	- €	
127	SP 10 di Finale	FINALE EMILIA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza Ponte sul canale consorziale Palata km 4+490	7707	149.963,01 €	O.C. n. 57/2013	149.963,01 €	- €	- €	- €	
128	SP 468 di Correggio	FINALE EMILIA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza ponte sul Canale Diversivo Burana km 64+310	7708	29.999,70 €	O.C. n. 57/2013	29.999,70 €	- €	- €	- €	
129	SP 8 di Mirandola	MIRANDOLA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza cavalcaferrovia "BO-VR" km 20+500	7821	28.931,36 €	O.C. n. 57/2013	28.931,36 €	- €	- €	- €	
130	SP 11 della Pioppa	SAN POSSIDONI	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza Ponte Pioppa km 4+350	7859	28.931,36 €	O.C. n. 57/2013	28.931,36 €	- €	- €	- €	
131	SP 468 di Correggio	FINALE EMILIA	Viabilità	Lavori	C	Messa in sicurezza cavalcaferrovia "BO-VR" km 54+600	7890	366.999,99 €	O.C. n. 57/2013	366.999,99 €	- €	- €	- €	
subtotale "Lavori"								34.929.871,86 €		13.154.388,22 €	12.573.584,70 €	516.882,72 €	8.685.016,22 €	
TOTALE GENERALE								39.223.892,43 €		14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €	



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Arredi

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
15	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per edificio EST realizzato da RER		90.930,79 €	OPC 665/2013	90.568,97 €	- €	- €	361,82 €	
16	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi palestra e palazzina 2003		46.725,76 €	Provincia	- €	- €	- €	46.725,76 €	
17	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto e installazione tendone separatore palestra		30.856,86 €	OPC 444/2015	28.820,52 €	- €	- €	2.036,34 €	
18	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto e installazione tendone separatore palestra		9.908,22 €	OPC 3231/2016	9.417,13 €	- €	- €	491,09 €	
19	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per rientro Nuovo Edificio (palestra, aule, uffici)		38.829,74 €	Provincia	- €	- €	- €	38.829,74 €	
21	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per moduli PMS messi a disposizione da RER		16.940,37 €	OPC 665/2013	16.940,37 €	- €	- €	- €	
22	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per rientro nell'edificio storico		33.835,23 €	Provincia	- €	- €	- €	33.835,23 €	
23	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi - 2020		15.844,87 €	Provincia	- €	- €	- €	15.844,87 €	
29	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per biblioteca Luosi (cofinanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola)		32.127,48 €	Provincia	- €	- €	15.000,00 €	17.127,48 €	Cofinanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
38	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per laboratorio CALVI		138.051,09 €	OPC 444/2015	138.051,09 €	- €	- €	- €	
39	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per rientro nell'edificio storico compreso Aula Magna e Lab. EST - Calvi		56.632,02 €	OPC 665/2013	7.646,00 €	- €	- €	48.986,02 €	
40	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per rientro nell'edificio storico compreso Aula Magna e Lab. EST - Morandi		56.264,50 €	OPC 665/2013	42.136,52 €	- €	- €	14.127,98 €	
52	LS Fanti	CARPI	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi		7.250,59 €	Provincia	- €	- €	- €	7.250,59 €	
54	IPAA Spallanzani	CASTELFRANCO EMILIA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per n. 2 Edifici EST realizzati da RER		25.200,87 €	Provincia	- €	- €	- €	25.200,87 €	
62	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per Via Ganaceto		33.665,72 €	Provincia	- €	- €	- €	33.665,72 €	
63	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi per sede Via Servi dopo adeguamento		54.878,89 €	Provincia	- €	- €	- €	54.878,89 €	
107	LS Tassoni	MODENA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi		1.049,20 €	Provincia	- €	- €	- €	1.049,20 €	
116	ITI - IPI Levi	VIGNOLA	Edilizia	Arredi	C	Acquisto arredi		8.368,09 €	Provincia	- €	- €	- €	8.368,09 €	
subtotale "Arredi"								697.360,29 €		333.580,60 €	- €	15.000,00 €	348.779,69 €	
TOTALE GENERALE								39.223.892,43 €		14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €	



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Affitto

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note	
68	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2013)		444.875,51 €	OPC 665/2013	444.875,51 €	- €	- €	- €		
69	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2013)		291.248,73 €	OPC 1297/2013	291.248,73 €	- €	- €	- €		
70	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2014)		268.180,96 €	OPC 1297/2013	153.626,77 €	- €	- €	114.554,19 €		
71	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2015)		412.723,88 €	Provincia	- €	- €	- €	412.723,88 €		
72	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2016)		412.723,88 €	Provincia	- €	- €	- €	412.723,88 €		
73	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2017)		412.723,87 €	Provincia	- €	- €	- €	412.723,87 €		
74	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto	C	Affitto sede provvisoria via Sgarzeria e Via Rainusso (al 30/12/2018)		412.723,88 €	Provincia	- €	- €	- €	412.723,88 €		
subtotale "Affitto"								2.655.200,71 €		889.751,01 €	- €	- €	1.765.449,70 €		
TOTALE GENERALE								39.223.892,43 €		14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €		



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Affitto palestre

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
12	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra 2012-2013		43.066,41 €	OPC 665/2013	43.066,41 €	- €	- €	- €	
36	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra 2012-2013-2014		12.932,00 €	OPC 1297/2013	12.932,00 €	- €	- €	- €	
37	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra 2012-2013-2014		66.048,70 €	OPC 665/2013	66.048,70 €	- €	- €	- €	
45	ITC Meucci	CARPI	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra polo scolastico 2012-2013		22.251,90 €	OPC 665/2013	22.251,90 €	- €	- €	- €	
75	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2012 - 2013		24.103,20 €	OPC 665/2013	24.103,20 €	- €	- €	- €	
76	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2013 - 2014		23.628,96 €	Provincia	- €	- €	- €	23.628,96 €	
77	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2014 - 2015		34.504,04 €	Provincia	- €	- €	- €	34.504,04 €	
78	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2015 - 2016		31.890,80 €	Provincia	- €	- €	- €	31.890,80 €	
79	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2016 - 2017		30.970,92 €	OPC 665/2013	19.734,35 €	- €	- €	11.236,57 €	
80	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2017 - 2018		36.844,00 €	OPC 1297/2013	568,00 €	- €	- €	36.276,00 €	
87	ITG Guarini	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra 2012-2013 ITG Guarini + LS Wiligelmo		8.913,35 €	OPC 665/2013	8.913,35 €	- €	- €	- €	
96	Polo Corni - Selmi via	MODENA	Edilizia	Affitto palestre	C	Affitto palestra a.s. 2012 - 2013		8.087,27 €	OPC 665/2013	8.087,27 €	- €	- €	- €	
subtotale "Affitto palestre"								343.241,55 €		205.705,18 €	- €	- €	137.536,37 €	
TOTALE GENERALE								39.223.892,43 €		14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €	



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Traslochi

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
8	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da edificio inagibile a EST regionale		43.434,05 €	OPC 665/2013	43.434,05 €	- €	- €	- €	
9	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco 2019		20.252,00 €	OPC 665/2013	20.252,00 €	- €	- €	- €	
10	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da sede inagibile a ex caserma carabinieri e trasloco da caserma a Palazzina 2003		33.420,45 €	OPC 665/2013	33.420,45 €	- €	- €	- €	
11	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco generale da EST a nuovo edificio		9.998,73 €	Provincia	- €	- €	- €	9.998,73 €	
24	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da edificio inagibile (ITI Luosi) a PMS Regionale		24.359,72 €	OPC 665/2013	24.359,72 €	- €	- €	- €	
25	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da edificio inagibile (LS Pico) a PMS Regionale		10.701,24 €	OPC 665/2013	10.701,24 €	- €	- €	- €	
26	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco generale (ITI Luosi) da PMS Regionale a edificio ristrutturato		24.165,09 €	OPC 665/2013	24.165,09 €	- €	- €	- €	
27	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco generale (LC Pico) da PMS Pico e PMS Luosi		21.119,60 €	OPC 665/2013	21.119,60 €	- €	- €	- €	
28	ITI Luosi	MIRANDOLA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco generale LC Pico e ex EST Galilei dopo ristrutturazione		34.892,00 €	Provincia	- €	- €	- €	34.892,00 €	
34	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da edificio inagibile a PMS regionale		24.085,66 €	OPC 665/2013	24.085,66 €	- €	- €	- €	
35	Polo Calvi - Morandi	FINALE EMILIA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco generale da PMS a edificio ristrutturato		92.160,47 €	OPC 665/2013	79.567,75 €	- €	- €	- €	12.592,72 €
64	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da edificio inagibile Via dei Servi a Sede Provvisoria di Via Sgarzeria		38.822,36 €	OPC 665/2013	38.822,36 €	- €	- €	- €	
65	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco per rientro da Via Sgarzeria a nuova sede Via Dei Servi		46.744,30 €	Provincia	- €	- €	- €	46.744,30 €	
66	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco per rientro da Via Rainusso a nuova sede Via Dei Servi		15.072,08 €	OPC 665/2013	15.072,08 €	- €	- €	- €	
67	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Traslochi	C	Trasloco da San Filippo a Via Ganaceto		7.242,22 €	Provincia	- €	- €	- €	- €	7.242,22 €
subtotale "Traslochi"								446.469,97 €		335.000,00 €	- €	- €	111.469,97 €	
TOTALE GENERALE								39.223.892,43 €		14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €	



Riepilogo Generale Interventi Finanziati - SISMA 2012 - Trasporto

N.	Istituto	Comune	Settore	Tipo Intervento	Stato	Descrizione Progetto	Cod. Int.	Importo Speso	Norma finanz.	Importo erogato Regione	Donazioni	Altre fonti finanziarie	Assicurazione	Note
13	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Trasporto	C	Spese di trasporto verso laboratori sede storica e palestre fino al 30/06/2016		62.627,25 €	Provincia	- €	- €	- €	62.627,25 €	
14	ITI Galilei	MIRANDOLA	Edilizia	Trasporto	C	Spese di trasporto verso laboratori sede storica e palestre fino al 30/06/2018		9.275,98 €	Provincia	- €	- €	- €	9.275,98 €	
81	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Trasporto	C	Trasporto vero palestra sostitutiva fino al 2016		60.792,03 €	Provincia	- €	- €	- €	60.792,03 €	
82	ISA Venturi	MODENA	Edilizia	Trasporto	C	Trasporto vero palestra sostitutiva fino al 2018		14.428,00 €	Provincia	- €	- €	- €	14.428,00 €	
88	ITG Guarini	MODENA	Edilizia	Trasporto	C	Trasporto verso palestra sostitutiva a.s. 2012 - 2013		4.624,79 €	Provincia	- €	- €	- €	4.624,79 €	
subtotale "Trasporto"								151.748,05 €		- €	- €	- €	151.748,05 €	
TOTALE GENERALE								39.223.892,43 €		14.918.425,01 €	12.573.584,70 €	531.882,72 €	11.200.000,00 €	
